

Bogotá D.C.

PARA: GABRIEL VELEZ CALDERON
Gerente de Contratación (E)

DE: DANIEL FRANCISCO TENJO
Gerente Proyectos Carretero I

ASUNTO: Informe Ejecutivo Carretero. Contrato de Concesión No. GG-046-2004. Contrato de Interventoría No. 439 de 2015. Proyecto Pereira – La Victoria.

Respetado Doctor:

En atención a la comunicación 2017-305-003236-3 del 27/02/2017, con toda atención se envía el Informe Ejecutivo Carretero (Formato gcsp-f-227) del proyecto Pereira – La Victoria.

Cordialmente,

DANIEL FRANCISCO TENJO SUAREZ
Gerente Proyectos Carretero I

Anexos: Un (1) Folio.
Proyecto: Arq. Jaime Fernando Ortiz Díaz - Experto 8 - Supervisor PLV
Borrador: 20173050006183.
GADF-F-012

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-227
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	22/02/2017


INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO	PROYECTO	Pereira La Victoria	FECHA ACTUALIZACIÓN	22/02/2017
--------	----------	---------------------	---------------------	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

																							
CONCESIONARIO		INTERVENTORIA		ANI		Vicepresidencia gestión contractual																	
Concesionario de Occidente		Consortio Infraestructura 4G																					
Gerente	Leonardo Salas	Gerente	Erika Acosta	Supervisor del Contrato		Daniel Francisco Tenjo																	
Nº contrato	GG-046 de 2004	Nº contrato	439 de 2015																				
Composición Accionara		Composición Accionara		Apoyo a las Supervisión		Jaime Fdo Ortiz D.																	
<table><tr><td>Comercial del Patrimonio S.A.S</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>Ingenieros S.A.S</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>Aquimesa S.A.</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>Pobla S.A.S</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>Grupos y Construcciones S.A.S</td><td>99.96%</td></tr></table>		Comercial del Patrimonio S.A.S	0.01%	Ingenieros S.A.S	0.01%	Aquimesa S.A.	0.01%	Pobla S.A.S	0.01%	Grupos y Construcciones S.A.S	99.96%	<table><tr><td>LPS S.A.S y Colsa (Lap)</td><td></td></tr><tr><td>Grupo PPS S.A.S (Colsa)</td><td></td></tr><tr><td>Siga Ingeniería</td><td></td></tr></table>		LPS S.A.S y Colsa (Lap)		Grupo PPS S.A.S (Colsa)		Siga Ingeniería					
Comercial del Patrimonio S.A.S	0.01%																						
Ingenieros S.A.S	0.01%																						
Aquimesa S.A.	0.01%																						
Pobla S.A.S	0.01%																						
Grupos y Construcciones S.A.S	99.96%																						
LPS S.A.S y Colsa (Lap)																							
Grupo PPS S.A.S (Colsa)																							
Siga Ingeniería																							

FECHAS IMPORTANTES

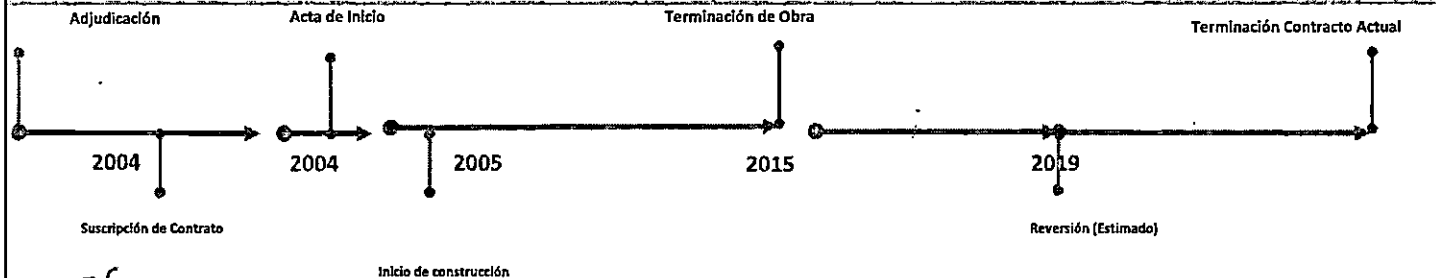

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

99,5%	FASE ACTUAL	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
% DE AVANCE OBRAS BÁSICAS		

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1			T2			T3		
	Inicio	28/03/05	Fin	Inicio	28/03/05	Fin	Inicio	28/03/05	Fin
Trámite Ambiental	100%	1		100%	2		100%	3	
Disponibilidad Predial	100%	2		100%	3		100%	4	
Segunda Calzada	C	30.03	3						
	E	30.03							
	P	30.03							
Puentes Vehiculares	C								
	E								
	P								
Rehabilitación	C	30.03	4	8,15			7		
	E	30.03		8,15	4		7	4	
	P	30.03		8,15			7		
Doble Calzada	C								
	E								
	P								

INFORME DE CUMPLIMIENTO

CODIGO		PROYECTO				FECHA DE INICIACIÓN				FECHA DE CANCELACIÓN			
		Pereira La Victoria								22/02/2017			
TEMAS		T4											
Fechas		Inicio	28/03/05	Fin	27/04/07	Inicio		Fin		Inicio		Fin	
Trámite Ambiental		100%											
Disponibilidad Predial		100%											
Segunda Calzada	C												
	E												
	P												
Puentes Vehiculares	C												
	E												
	P												
Rehabilitación	E	9,3											
	P	9,3											
	C												
Doble Calzada	E												
	P												
	C												

Convenciones:

C: Contratada
E: Ejecución
P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016

TRIMESTRE I

No hay obras por inaugurar

1,125E+12

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$66.870.000.000

Pesos Dic
2004

VALOR ACTUAL

\$93.990.503.512

Pesos Dic
2004

78,8

% CUMPLIMIENTO
INGRESO ESPERADO

INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO

\$367.809.166.000

Pesos Dic 2004

INGRESO GENERADO

\$289.731.430.942

Pesos Dic 2004

100,0

% CUMPLIMIENTO
APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$83.222.050.535

Pesos Dic
2004

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$0

Pesos Dic 2004

VERIFICADO

SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO
Daniel Francisco Tenjo

APOYO A LA SUPERVISIÓN
Jaime Fdo Ortiz D.
