



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227	
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO		FECHA	09/12/2016


INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	PROYECTO	Ampliación a Tercer Carril doble Calzada Bogotá - Giradot	FECHA ACTUALIZACIÓN	31/12/2016
--------	----------	---	---------------------	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO Vía 40 express S.A.S.		INTERVENTORIA Consorcio Seg- Incoplan		ANI Vicepresidencia Ejecutiva
Gerente	Diego Arroyo Baptiste	Gerente	Cesar Sánchez Bachiller	Supervisor del Contrato
Nº contrato	APP No. 04 del 18 de octubre de 2016	Nº contrato	395 del 29 de Noviembre de 2016	Vicepresidente Ejecutivo
Composición Accionara	VINCI HIGHWAYS 50.0% CONSTRUCTORA CONCRETO S.A. 25% INDUSTRIAL CONCRETO S.A.S. 25%	Composición Accionara	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACIÓN S.A. 49% SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA S.A. 51%	Apoyo a la Supervisión Andrés Renaldo Silva Villegas - Gerente Funcional VEI Luis Antonio Rodríguez - Apoyo Técnico y Operativo VEI Ingrid Esther Cera Jimenez - Apoyo Financiero VEI Norma Liliana Gutierrez Gamboa - Apoyo Ambiental VPRE Diana Guselt Torres Robayo- Apoyo Técnico Predial VPRE José Ernesto López Arévalo - Apoyo Jurídico Predial VPRE Juan Sebastián Rodríguez Guerrero - Apoyo Jurídico - VI Janneth Alexandra Avellaneda Bolívar - Apoyo social - VPRE Diana Carolina García Ruiz - Apoyo Defensa Judicial - VI Glauys Lseth Quiñones Quiñones - Apoyo Riesgos - VPRE

FECHAS IMPORTANTES

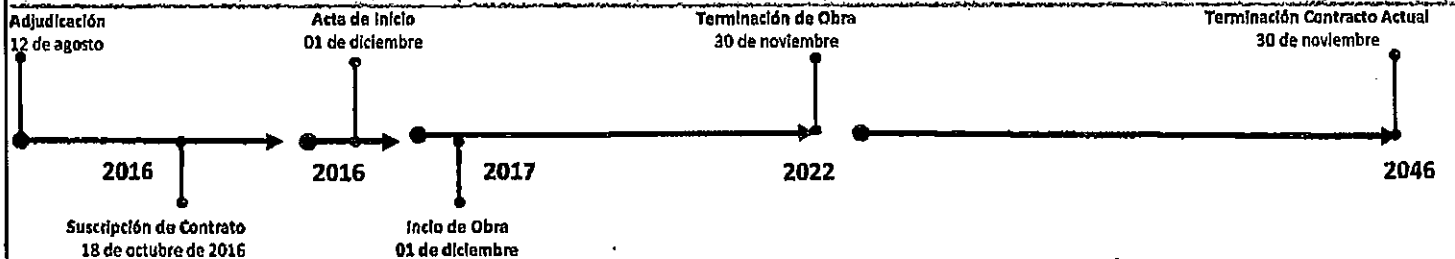

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

8%

FASE ACTUAL PRECONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF

TEMAS	UFO				UF1				UF2			
	Inicio	01/12/16	Fin	30/11/17	Inicio	NA	Fin	NA	Inicio	NA	Fin	NA
Trámite Ambiental	100				0				2			
Disponibilidad Predial	100				0				0			
Segunda Calzada	C	NA			NA				NA			
	E	NA			NA				NA			
	P	NA			NA				NA			
Puentes Vehiculares	C	0			4				0			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Rehabilitación	C	0			50.95				4			
	E	0			0				0			
	P	0			0				0			
Doble Calzada	C	NA			NA				NA			
	E	NA			NA				NA			
	P	NA			NA				NA			

INFORME EJECUTIVO CARRETERO


CODIGO		PROYECTO Ampliación a Tercer Carril doble Calzada Bogotá - Giradot								FECHA ACTUALIZACIÓN 31/12/2016			
TEMAS		UF3				UF4				UF5			
Fechas		Inicio	NA	Fin	NA	Inicio	NA	Fin	NA	Inicio	NA	Fin	NA
Trámite Ambiental		0				0				0			
Disponibilidad Predial		0				0				0			
Segunda Calzada	C	NA				NA				NA			
	E	NA				NA				NA			
	P	NA				NA				NA			
Puentes Vehiculares	C	3				1				4			
	E	0				0				0			
	P	0				0				0			
Rehabilitación	C	11				8				0			
	E	0				0				0			
	P	0				0				0			
Doble Calzada	C	NA				NA				NA			
	E	NA				NA				NA			
	P	NA				NA				NA			

TEMAS		UF6				UF7				UF8			
Fechas		Inicio	NA	Fin	NA	Inicio	NA	Fin	NA	Inicio	NA	Fin	NA
Trámite Ambiental		0				0				0			
Disponibilidad Predial		0				0				0			
Segunda Calzada	C	NA				NA				NA			
	E	NA				NA				NA			
	P	NA				NA				NA			
Puentes Vehiculares	C	2				1				0			
	E	0				0				0			
	P	0				0				0			
Rehabilitación	C	0				0				9,86			
	E	0				0				0			
	P	0				0				0			
Doble Calzada	C	NA				NA				NA			
	E	NA				NA				NA			
	P	NA				NA				NA			

Convenciones:
 C: Contratada
 E: Ejecución
 P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
 \$4,197,839,609,774

Pesos
 Dic - 2014

VALOR ACTUAL
 \$4,197,839,609,774

Pesos
 Dic - 2014

0.62%

% CUMPLIMIENTO VPIP

VPIP ACTUAL
 \$2,375,671,302,998

Pesos
 2014

VPIP GENERADO
 \$14,643,736,624.36

Pesos
 2014

No aplica

% CUMPLIMIENTO
 APORTES ANI

APORTES ANI
 TOTAL CONTRATO
 \$0

Pesos
 2014

APORTES ANI
 GIRADOS A FIDUCIA
 \$0

Pesos
 2014

VERIFICADO

ANDRÉS RENALDO SILVA VILLEGAS
 Gerente Técnico VEI

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ PIÑERO
 Apoyante supervisión - Técnico y Operativo
