

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-227
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	12/9/2016


INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	C-55	PROYECTO	Vía al Nus	FECHA ACTUALIZACIÓN	2/9/2017
--------	------	----------	------------	---------------------	----------

1. INFORMACIÓN GENERAL

 CONCESIONARIO Concesionario Vías del Nus S.A.S.		 INTERVENTORIA Consorcio SERVINC - VQM		 ANI Vicepresidencia
Gerente Ricardo López Lombana Nº contrato 001 de 2016		Gerente Álvaro Bettin Diago Nº contrato 071 de 2016		Supervisor del Contrato Gloria Ines Cardona Botero
Composición Accionara - Latino S.A. 1.10% - EDL S.A.S. 3.70% - Construcciones el Condor S.A. 21.10% - SP Ingenieros S.A. 22.20% - MINICIVIL S.A. 51.80%		Composición Accionara - VQM S.A.S. 30% - SERVINC LTDA 70%		Apoyo a las Supervisión Doris Catalina Ospina V - Líder Equipo Apoyo a la Supervisión Lili Estefany Cordoba - Apoyo Técnico Sonia Jaqueline Angarita - Apoyo Jurídico Nestór Raúl Palacios - Apoyo Financiero Jhon Jairo Arevalo - Apoyo Jurídico Adriana Urrea Zabala - Apoyo Social Yeny Milena Díaz - Apoyo en Riesgos Jairo Andrey Vejarano - Apoyo Técnico Predial Diana María Vaca - Apoyo Jurídico Predial

FECHAS IMPORTANTES

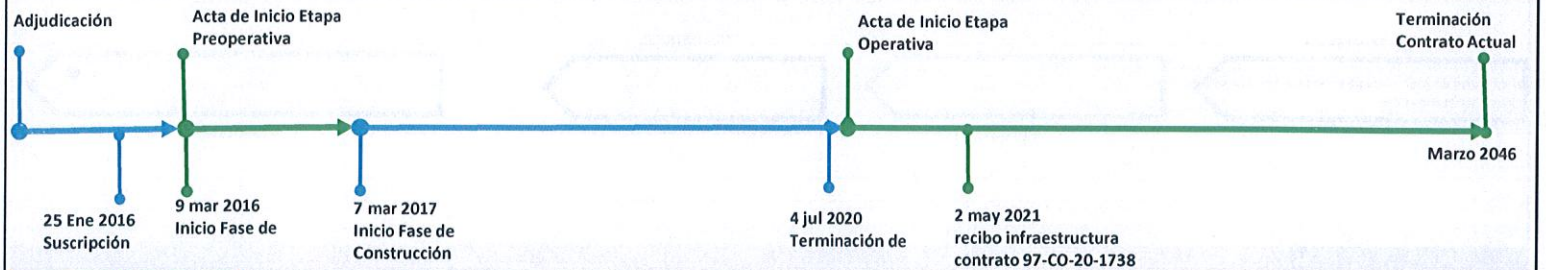

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

28%

FASE ACTUAL **CONSTRUCCIÓN**

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS		UF-1			UF-2			UF-3		
Fechas		Inicio	21/05/18	Fin	Inicio	26/10/18	Fin	Inicio	15/01/18	Fin
Tramite Ambiental		40			100			100		
Disponibilidad Predial		57			92			96		
Túneles	C							-		
	E							-		
	P							4.2		
Puentes Vehiculares	C	-			-					
	E	-			-					
	P	4			4					
Rehabilitación	C									
	E									
	P									
Doble Calzada	C									
	E									
	P	9.6			5.1					

INFORME EJECUTIVO CARRETERO


CODIGO	C-55	PROYECTO	Via al Nus						FECHA ACTUALIZACIÓN				2/9/2017
TEMAS		UF-4			UF-5			UF-6 (operación y mtto)					
Fechas		Inicio	15/06/18	Fin	19/11/19	Inicio	07/03/17	Fin	16/01/20	Inicio	02/05/21	Fin	08/03/46
Tramite Ambiental						100				N/A			
Disponibilidad Predial		47				100				N/A			
Túneles	C												
	E												
	P												
Puentes Vehiculares	C	-											
	E	-											
	P	7											
Rehabilitación	E					-							
	P					35.6							
Doble Calzada	C	-											
	E	-											
	P	5.5											

Convenciones:

C: Contratada
E: Ejecución
P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2017



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$2,490,135,961,386

Pesos 2013

VALOR ACTUAL

\$2,490,135,961,386

Pesos 2013

0.0

% CUMPLIMIENTO
INGRESO ESPERADO

INGRESO ESPERADO TOTAL
CONTRATO

\$1,341,137,452,328

Pesos
2013

INGRESO GENERADO

Pesos
2013

N/A

% CUMPLIMIENTO
APORTES ANI

APORTES ANI
TOTAL CONTRATO

N/A

Pesos
2013

APORTES ANI
GIRADOS A FIDUCIA

N/A

Pesos
2013

VERIFICADO

Gloria Ines Cardona Botero

GLORIA INES CARDONA BOTERO
SUPERVISOR DE PROYECTO CARRETERO

Doris Catalina Ospina Vecandia

DORIS CATALINA OSPINA VECANDIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
