



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-227
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	12/9/2016


INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	PROYECTO	Autopistas Conexión Norte	Fecha Actualización	14/2/2018 con corte a 31/12/2017
--------	----------	---------------------------	---------------------	----------------------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO Auopistas del Nordeste SAS		INTERVENTORIA Consorcio 4G		ANI Vicepresidencia Gestion Contratual	
Gerente Juan Manuel Mariño		Director Diego Arenas		Supervisor del Contrato Gloria Ines Cardona Botero - Gerente de Proyecto	
Nº contrato 009 de 2017		Nº contrato 015 de 2015		Apoyo a las Supervisión Lider Equipo Supervisión Willson Ballesteros Duarte Ingeniera de Apoyo Yanny Arlenis Chavez Cuero Apoyo Financiero Mario Rodriguez Apoyo Jurídico Monica Olarte Apoyo Predial Wilfreyer Chacon Hernandez Apoyo Social Diana Marcela Carranza Torres Apoyo Ambiental Richard Andres Ortiz Torres Apoyo Riesgos Jimmy Suarez Apoyo Juridico Predial Poema Cardona	
Composición Accionara <ul style="list-style-type: none"> Valores Y Contratos S.A 12.5% SP Ingenieros S.A.S 13.5% Unidad de Infraestructura y Construcciones Asociadas S.A.S 20.6% Solarate Nacional de Construccion S.A.S 13.3% Ortiz Construcciones Y Proyectos S.A. Sucursal Colombia 25.5% KMA Construcciones S.A 14.7% 		Composición Accionara <ul style="list-style-type: none"> Arenas De la Hoz 15% CELQO SAS 25% INGECON SAS 60% 			

FECHAS IMPORTANTE

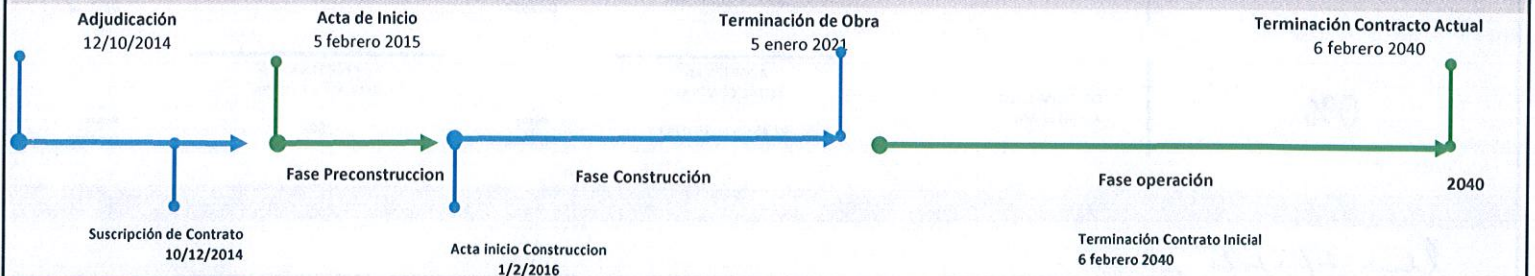

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

17.18%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	UF1 Remedios Zaragoza				UF2-1 Caucasia Zaragoza				UF2-2 Variante Caucasia			
	Inicio	22/01/17	Fin	04/01/21	Inicio	01/02/16	Fin	15/01/19	Inicio	01/11/16	Fin	15/01/19
Tramite Ambiental	100				100				100			
Disponibilidad Predial	81				86				93			
Calzada Sencilla	58								5			
	C				11				1			
	E	5			6				0			
Puentes Vehiculares					82							
	C											
	E											
Mejoramiento												
	C											
	E											
Doble Calzada												
	C											
	E											

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	PROYECTO Autopistas Conexión Norte	Fecha Actualización	14/2/2018 con corte a 31/12/2017
---------------	---	----------------------------	----------------------------------

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2017



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$1,300,273,784,420		\$1,300,273,784,420	
<i>Pesos Dic 2012</i>		<i>Pesos Dic 2012</i>	
0%	% CUMPLIMIENTO VPIP	VPIP ACTUAL \$500,960,159,494 <i>Pesos Dic 2012</i>	VPIP GENERADO \$0 <i>Pesos Dic 2012</i>
0%	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO \$2,451,522,191,783 <i>Pesos Dic 2012</i>	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA \$0 <i>Pesos Dic 2012</i>

VERIFICADO

M. H. B.
 SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

[Handwritten Signature]
 APOYO A LA SUPERVISIÓN
