

INFORME EJECUTIVO CARRETERO


CODIGO	PROYECTO	Transversal de las Américas - 1				FECHA ACTUALIZACIÓN	26/02/2018
TEMAS	MOMPOX		SAN PABLO				
Fechas	Inicio	23/10/12	Fin	30/07/17	Inicio	Fin	30/04/11
Tramite Ambiental	100				100		
Disponibilidad Predial	100				70		
Segunda Calzada	C						
	E						
	P						
Puentes Vehiculares	C	1			1		
	E	1			81%		
Rehabilitación	P	0			19%		
	C	135					
	E	135					
Calzada Sencilla	P	0,0					
	C	28,35			42,89		
	E	28,35			15,25		
	P	0			27,64		

Convenciones:

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2018



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$1.158.081.139,000

Pesos Corrientes 2010

VALOR ACTUAL

\$1.761.438.808,961

Pesos Corrientes 2017

100,0

% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO

VPIT ACTUAL

\$1.158.081.139,000

Corrientes

VPIT GENERADO

\$1.158.081.139,000,00

Corrientes

100,0

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$1.534.490.000,000

Corrientes

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$1.534.490.000,000

Corrientes

VERIFICADO

Alberto Augusto Rodríguez Ortiz

SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO
Alberto Augusto Rodríguez Ortiz

Lina Patricia Calvo Orozco

APOYO A LA SUPERVISIÓN
Lina Patricia Calvo Orozco



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-227
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	09/12/2016


INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	PROYECTO	Transversal de las Américas - 1	FECHA ACTUALIZACIÓN	26/02/2018
--------	----------	---------------------------------	---------------------	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO VIAS DE LAS AMERICAS SAS Gerente: Edgar Herrera Marciales N° contrato: 008 DE 2010 Composición Accionara: Valoren 33%, El Condor 67%		INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORIA TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS Gerente: Carlos Alonso Cortés Vivas N° contrato: 020 DE 2012 Composición Accionara: Paulo Emilio Bravo 33%, Velnec 33%, Interdiseños 34%		ANI Vicepresidencia de Gestión Contractual Supervisor del Contrato: Alberto Augusto Rodriguez Ortiz Apoyo a las Supervisión: Lina Patricia Calvo Orozco	
--	--	--	--	--	--

FECHAS IMPORTANTES

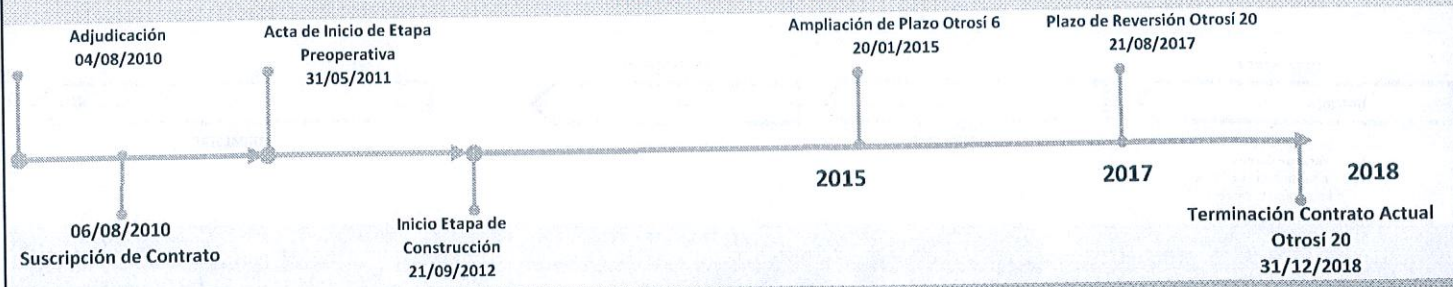

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

91%

FASE ACTUAL CONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	URABÁ			MONTERÍA			SAN MARCOS		
	Inicio	24/09/12	Fin	Inicio	22/10/12	Fin	Inicio	24/04/13	Fin
Tramite Ambiental	100		30/07/18	100		30/07/18	100		30/07/18
Disponibilidad Predial	90			100			100		
Segunda Calzada	C	24		14,78					
	E	21,7		12,1					
	P	2,3		2,68					
Puentes Vehiculares	C						6		
	E						6		
	P						0		
Rehabilitación	C	156,7		121,07			76,36		
	E	151,5		121,07			76,36		
	P	5,2		0,0			0,0		
Calzada Sencilla	C	11,7		29,69			3		
	E	11,7		29,69			3		
	P	0,0		0,0			0		
