



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-223
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	FECHA	09/12/2016

CÓDIGO
AC-01

PROYECTO
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
Contrato No. 058-CON-2000

FECHA ACTUALIZACIÓN
26/09/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO
CONCESIONARIO AEROCALI S.A.

INTERVENTORÍA OPERATIVA
CONSORCIO INTERCOL SP

ANI
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Gerente
Nº contrato
RICARDO ALBERTO LENIS STEFFENS
058-CON-2000

Director
Nº contrato
LUIS FERNANDO ZULUAGA TORRES
801 DE 2015

Gerente
Maria Eugenia Arcila Zuluaga

Accionistas	% de participación
AEMA DESARROLLO INTERNACIONAL S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIA S.A.	51,01 %
	48,99 %

Accionistas	% de participación
JORGE PIDDO - SUCURSAL COLOMBIA	51%
SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.	49%

Apoyo a la Supervisión

- Carolos Alberto Carrasco Ramirez (Apoyo Lider)
- Ginna Carolina Calvo Gutierrez (Técnico)
- Cristian Rafael Medina Martínez (Ambiental)
- Nohora Millera Garzon Delgado (Financiero)
- Clemente Alberto Echeverrey Cardona(Juridico)
- Germán Bohorquez (Predial)
- Lina Leddy Leal Diaz (Riesgos)
- Paula Torres Perico (Social)


Aeropuertos

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca.

Objeto del Contrato:

Contrato de Concesión para la Administración, Operación y Explotación Económica del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca.

FECHAS IMPORTANTES

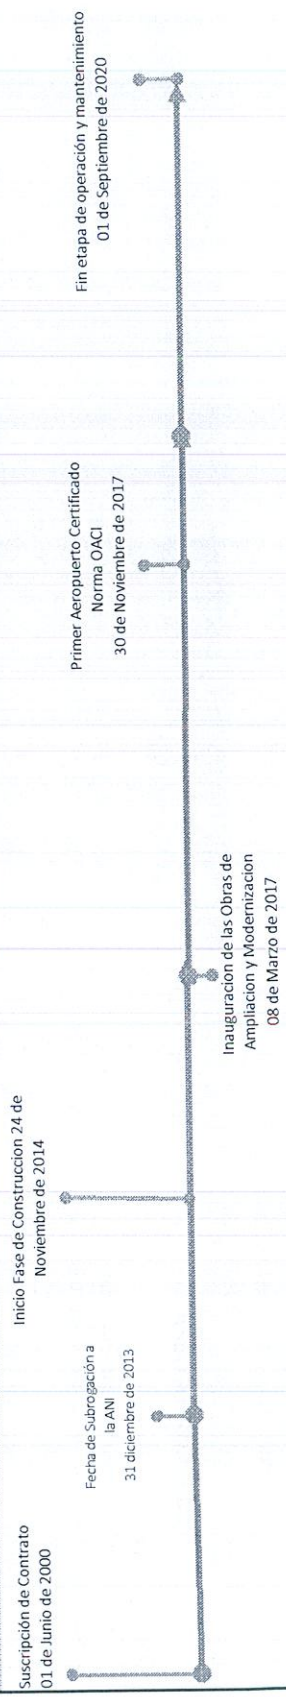

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

ESTADO ACTUAL Etapa de Operación y Mantenimiento

100%

% DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)
Remodelación Antiguo Terminal	24/11/2014	25/11/2017	100,00%	100,00%	
Construcción Nueva Terminal Internacional	01/06/2015	08/03/2017	100,00%	100,00%	
Urbanismos y Accesos (Incluido el Viaducto)	03/07/2015	08/03/2017	100,00%	100,00%	\$ 189.900.961.886,00
Plataforma Internacional	01/06/2015	08/03/2017	100,00%	100,00%	
Obras de Certificación	11/04/2016	04/07/2017	100,00%	100,00%	
Construcción Cuartel de Bomberos	26/06/2015	15/05/2017	100,00%	100,00%	
Obras de adecuación de espacios para las autoridades aeroportuarias	05/09/2017	19/11/2017	100,00%	100,00%	\$ 1.745.315.075,00

2017

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

TRIMESTRE I

Inauguración de las Obras de Ampliación y Modernización
08 de Marzo de 2017

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

Primer Aeropuerto Certificado por la OACI
30 de Noviembre de 2017

VERIFICADO

Gerencia de Proyectos Aeroportuarios

Carlos Alberto Carrasco Ramirez - Apoyo a la Supervisión
