



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-223
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	FECHA	09/12/2016

### INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CÓDIGO	AC-01	PROYECTO	Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Sarmiento Angulo Contrato No. 6000169OK de 2006	FECHA ACTUALIZACIÓN	26/09/2018
--------	-------	----------	--	---------------------	------------

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO		INTERVENTORÍA TÉCNICA		ANI	
<p><b>OPAIN S.A. - Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional</b></p>		<p><b>INTERVENTORÍA CONSORCIO JFA - A&amp;C</b></p>		<p><b>VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p>	
Gerente	Alvaro Gonzalez Ringler	Director	Alfredo Diaz Granados Guida	GERENTE	Maria Eugenia Arcila Zuluaga
Nº contrato	6000169OK del 12 de septiembre de 2006	Nº contrato	8000047OK del 9 de mayo de 2008	Apoyo a la Supervisión	Bladimir Castilla Nieto (Cordinador) Pablo Andres Romero (Técnico) Mario Nicolas Cortes (Técnico) Jorge Jaramillo Torres (Técnico) Norma Liliana Gutierrez (Ambiental) Oscar Jaime Gonzalez (Financiero) Maria Fernanda Esteban (Juridico) Germán Bohorquez (Predial) Heriberto Amado (Riesgos) Stella Aldana (Social)
Composición Accionara		Composición Accionara			


Aeropuertos

Internacional Eldorado "Luis Carlos Galán Sarmiento" BOGOTA D.C.

Objeto del Contrato:

Contrato de Concesión para la Administración, Modernización y Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento del Área Concesionada del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.

### FECHAS IMPORTANTES

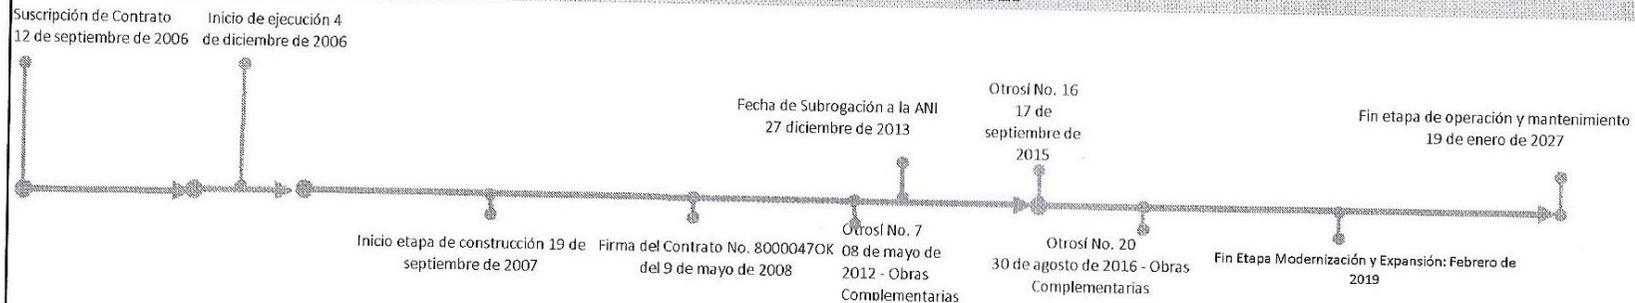

## 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO



96%

ESTADO ACTUAL

Etapa de Modernización y Expansión

% DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN

### SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)
Obra Voluntaria Muelle Norte	01/06/2015	06/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 325.000,00
Obra Voluntaria Muelle Sur	26/06/2015	06/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 104.269,00
Obras Complementarias Etapa I	30/08/2016	31/01/2018	100,00%	100,00%	\$ 11.593,00
Plataforma Equivalente en el Terminal de Carga	25/04/2018	28/02/2019	0,35%	6,63%	

### INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

2018

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV



VERIFICADO

  
 MARÍA EUGENIA ARCILA ZULUAGA - GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

  
 BLADIMIR ALBERTO CASTILLA NIETO - APOYO A LA SUPERVISIÓN
