


1. INFORMACIÓN GENERAL

| CONCESIONARIO                                                                                                                  | INTERVENTORIA                                                                                                       | ANI                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.</b> |  <b>CONSORCIO INTERAEROPUERTOS</b> |  <b>VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b> |

|                       |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Representante Legal   | Juan Francisco Herrera Bojanini                                                                                                       | Representante Legal   | David Ardila Briceño                                                                                                          | Supervisor del Contrato | Maria Eugenia Arcila Zuluaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nº contrato           | 003 - 2015                                                                                                                            | Nº contrato           | 196 - 2015                                                                                                                    |                         | Gerente de Proyectos Aeroportuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Composición Accionara | <div> <div>Inversiones Milenium Azcibo S.A.S. 17%</div> <div>Equipo Universal S.A. 41,68%</div> <div>Valores S.A. 41,68%</div> </div> | Composición Accionara | <div> <div>J. Felipe Ardila &amp; CIA S.A.S. 24%</div> <div>GNQ Ingeneria S.A.S. 35%</div> <div>Inter S.A.S. 41%</div> </div> | Apoyo a la Supervisión  | <div> <div>Prof. Ariel Muñoz Vargas</div> <div>Kimera Pinabón Lirioaneta</div> <div>Joel Vargas Miranda</div> <div>Yaelly Ardaya Alonso</div> <div>Alvaro Pabón Lozano</div> <div>Andrés Borja Guerra</div> <div>Germán Arturo Bohórquez Guzmán</div> <div>Victoria Eugenia Sánchez Zapata</div> <div>Jaime Martínez Montoli</div> <div>Reniffer Bustamante Moreno</div> </div> |

|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aeropuerto:          | Ernesto Cortíssoz                                                                                                                                                           |
| Objeto del Contrato: | Realizar la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación, modernización y reversión tanto del lado Aire como del lado Tierra del Aeropuerto. |

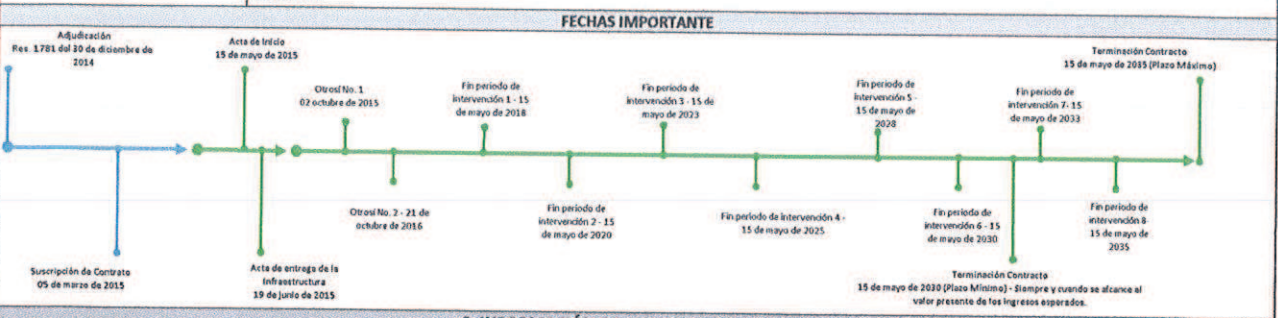

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

|                                                                                                                                                |               |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
|  <b>21%</b><br><small>% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL</small> | ESTADO ACTUAL | <b>Adecuación, Modernización y Mantenimiento</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|

| SEGUIMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y LADO AIRE                                                                                                                                                                             |                 |                      |              |             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| OBJETO DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                       | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | INVERSIÓN EJECUTADA (M\$) |
| Lado Aire - Pista:<br>*Repavimentación de Pista<br>*Nivelación RESA<br>*Nivelación de franjas de pista<br>*Adecuación y repavimentación márgenes de pistas<br>*Actualización balizamiento, reguladores, papis, cableado | 01/07/2016      | 27/12/2016           | 100%         | 35%         | \$ 59.470                 |
| Lado Aire - Calles de Rodaje A, B, C y D:<br>*Repavimentación<br>*Adecuación y repavimentación de márgenes<br>*Construcción de sobreanchos<br>*Adecuación Normatividad OACI Calles A1 y A2 Internacional                | 01/07/2016      | 27/12/2016           | 100%         | 24%         |                           |
| Lado Tierra - Nuevo edificio administrativo                                                                                                                                                                             | 24/10/2016      | 15/05/2018           | 12%          | 3%          |                           |

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA 2017

