



PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CÓDIGO	GCSP-F-223
FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	VERSIÓN	001
		FECHA	9/12/2016

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CÓDIGO	A-01	PROYECTO	Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena	FECHA ACTUALIZACIÓN	7/02/2018
--------	------	----------	--------------------------------------	---------------------	-----------

1. INFORMACIÓN GENERAL


CONCESIONARIO		INTERVENTORIA		ANI
SACSA - SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A.		UTCAC - UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN AEROPUERTO CARTAGENA		VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Gerente	Ramon Pereira Visbal	Gerente	Mayron Vergel Armenta	Supervisor del Contrato
Nº contrato	0186 de 1996	Nº contrato	001 de 2014	Maria Eugenia Arcila Zuluaga
Composición Accionara	<ul style="list-style-type: none"> COMOVIA S.A. 0.5% PROMOCIONES E INVERSIONES Y CIA. 0.5% SAVILENIO PEREZ SA Y CIA. 0.5% NOVOMIA S.A. 0.5% PROMOCIONES HOYO CALIFE Y CIA. 0.5% PROMOCIONES PALMERIA SA Y CIA. 0.5% TRASA S.A. 0.5% AVIATUR S.A. 0.5% INVERSIONES ARBIA S.A.E. 0.5% INVERSIONES INARIBOLUNGA RIVERO S.A. 0.5% PROMOCIONES EMPRESAS AEROPUERTO S.A. 0.5% INVERSIONES DE OJAS SORRETA Y CIA S.A. 0.5% INVERSIONES DE OJAS SORRETA Y CIA S.A. 0.5% RAMON FERRER VISBAL 0.5% PROMOCIONES FERRER VISBAL 0.5% INVERSIONES SAVAL SOCORRO S.A. 0.5% INVERSIONES LECNER ARBOHO 0.5% INVERSIONES SILVAR SOCORRO S.A. 0.5% INVERSIONES SILVAR SOCORRO S.A. 0.5% GRUPO INVERSIONES TERPEL S.A. 0.5% CONCEDES SA 0.5% AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ S.A. 0.5% 	Composición Accionara	<ul style="list-style-type: none"> BONIFER ESTRUCTURAS DE INGENIERIA S.A. 10% INTERPOSA S.A. 5% FACTORIA DE INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A. 20% 	<ul style="list-style-type: none"> Jorge Mogollon Monterrosa Paula Torres Perico Álvaro Pabón Lozano Nohora Milena Garzón Delgado Angela Paola Morales German Arturo Bohórquez Guzmán Daniel Hinestroza Carlos Acosta Medina

Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

Objeto del Contrato:

El objeto de este Contrato de Concesión es la administración y explotación económica por el sistema de concesión del Aeropuerto Rafael Núñez, ubicado en el Distrito Especial de Cartagena de Indias, el cual presta servicio principalmente a la ciudad de Cartagena. La administración y explotación económica incluyen el manejo y mantenimiento directo del terminal, pista, rampa, instalaciones aeroportuarias, ayudas visuales de aproximación, zonas accesorias y las Obras del Plan de Modernización y Expansión. La Aerocivil se reserva el manejo y la responsabilidad de las funciones de control y vigilancia del tráfico aéreo en ruta y el correcto funcionamiento y mantenimiento de las radioayudas aéreas, incluyendo las radioayudas de aproximación, y las comunicaciones y demás equipo destinado y necesario para el debido control aéreo establecidos por OACI.

FECHAS IMPORTANTES

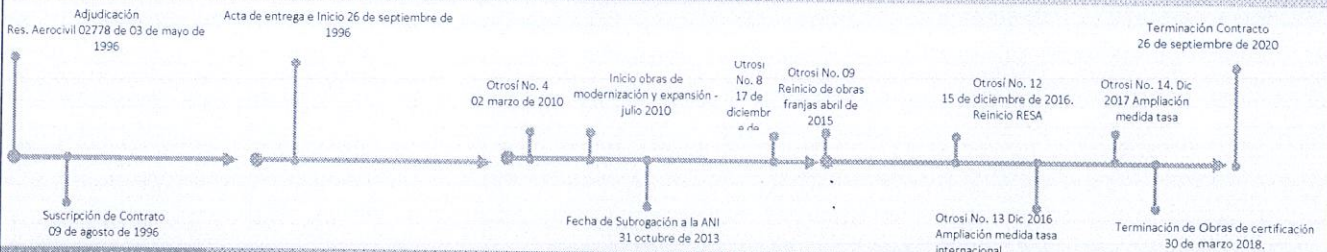

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

92%

ESTADO ACTUAL

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN (FINALIZACIÓN OBRAS CERTIFICACIÓN)

94 DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

SEGUIMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y PLATAFORMAS

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN EJECUTADA (MILES \$)
REPARACION PAVIMENTO PISTA	5/03/2010	15/10/2010	100%	100%	2.742.436
OBRAS DEL EDIFICIO ACTUAL (AMPLIACION)	5/03/2010	15/10/2013	100%	100%	24.270.228
REPARACION DE PLATAFORMA PR	5/04/2010	18/02/2011	100%	100%	1.676.982
CONSTRUCCION DE AREAS DE SEGURIDAD	21/02/2011	17/10/2012	100%	100%	10.958.713
CONFORMACION DE LAS FRANJAS DE PISTA DE CAÑO	30/04/2015	25/04/2016	100%	100%	2.176.910
CERRAMIENTO DE AREAS	22/06/2011	22/01/2013	Suspendida	48,9%	1.090.107
OBRAS AMBIENTALES (BARRERA CONTRA RUIDO CON TRASLAPOS)	22/08/2011	1/02/2013	Suspendida	3,9%	114.519
REPAVIMENTACION PISTA	1/09/2012	13/09/2013	100%	100%	6.538.644
REPAVIMENTACION PLATAFORMA	16/10/2013	29/06/2015	100%	100%	10.586.722
CONSTRCCION DE VIA PERIMETRAL DE INGRESOS ECO	1/05/2014	23/06/2015	Suspendida	56%	1.775.173
INFRAESTRUCTURA ECO SERVICIO	1/05/2014	24/08/2015	100%	100%	7.940.564
CERRAMIENTO DE AREAS VIA PERIMETRAL	1/08/2014	24/07/2015	Suspendida	7,4%	61.179
CUARTEL DE BOMBEROS SEI	8/05/2015	25/04/2016	100%	100%	3.604.265
READECUACION PLATAFORMA SUR	26/04/2016	26/07/2016	100%	100%	577.879

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA				2018		
TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV
		Abr ●				Oct
VERIFICADO						
<u><i>J.º Eugenia</i></u> GERENTE DE PROYECTOS ALTERNATIVOS				<u><i>[Firma]</i></u> APOYO A LA SUPERVISIÓN		
