

Para contestar cite:..

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2018-309-003913-3
Fecha: 27/02/2018 11:09:20->309
FUN: ALEXANDRA NAVARRO ER-703
Anexos: 2 Folios.



RAD_S
*AD_S**
_RAD_S*



Bogotá D.C.

PARA: **ALEXANDRA NAVARRO ERAZO**
Coordinadora GIT Contratación - VJ

DE: **MARÍA EUGENIA ARCILA ZULUAGA**
Gerente de Proyectos Aeroportuarios VGC

ASUNTO: Contrato de Concesión Bajo Modalidad APP No. 003 de 2015.
Remisión Informe Ejecutivo del Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Respetada Doctora Alexandra:


En cumplimiento a la circular No. 40 del 29 de Diciembre del 2016, emitida por la Vicepresidencia Jurídica de la Agencia, se da traslado para los fines pertinentes del escrito CIA-AEC-2018-0179 con el Formato GCSP-F-223 - Informe Ejecutivo del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, correspondiente al contrato de concesión No. 003 del 2015.

Cordialmente,



MARÍA EUGENIA ARCILA ZULUAGA
Gerente de Proyectos Aeroportuarios

Anexo: Lo enunciado en (2) folios.
Proyectó: Ing. Carlos Mauricio Piracón Sánchez. - Asistente a la Supervisión Técnica - VGC / Gerencia Proyectos Aeroportuarios.
Revisó: Ing. José Ariel Muñoz V. - Apoyo a la Supervisión Técnica - VGC / Gerencia Proyectos Aeroportuarios.
Nro. Borrador: 2018-3090005917
GADF-F-010





NIT 900.844.163-9

CIA-AEC-2018-0179

Soledad, 19 de Febrero de 2018

Señores

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Atn. Dra. MARÍA EUGENIA ARCILA

GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS ANI

**Calle 24 A No. 59 – 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2 Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C.**


**REF.: PROYECTO AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISOZ –
CONTRATO DE CONCESIÓN – ESQUEMA APP No. 003 DE 05 DE MARZO DE 2015**

Asunto: Remisión Informe Ejecutivo del Aeropuerto Ernesto Cortisoz

Cordial saludo,

En el ejercicio de nuestras funciones como Interventores del contrato de la referencia, nos permitimos remitirles el Informe Ejecutivo del Aeropuerto Ernesto Cortisoz con fecha de corte 31 de Diciembre de 2017. Es importante mencionar que el avance contemplado muestra la ejecución de Actuaciones relacionadas con obras. Así mismo, no incluye las actividades del reforzamiento estructural del Edificio Terminal de Pasajeros, pasarelas de embarque y máquinas y cintas transportadoras de equipajes, ya que el Concesionario no ha entregado los presupuestos de obra de dichas actividades.

Cordialmente,


LUIS G. NARVAEZ RICARDO
Director Interventoría
CONSORCIO INTERAEROPUERTOS


AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad No. 2018-409-017431-2
Fecha: 20/02/2018 14:32:47-309
CIU: CONSORCIO INTERAEROPUERTOS CIA
Anexos: 1 FOLIO



C.C. Ing. José Ariel Muñoz – Supervisor Proyecto ANI
Anexos: dos (02) folios

Elaboró: Glen Ruggiero Hernández – Ingeniero Residente CIA
Revisó: Angie P. Luna P. - Asistente Jurídico CIA

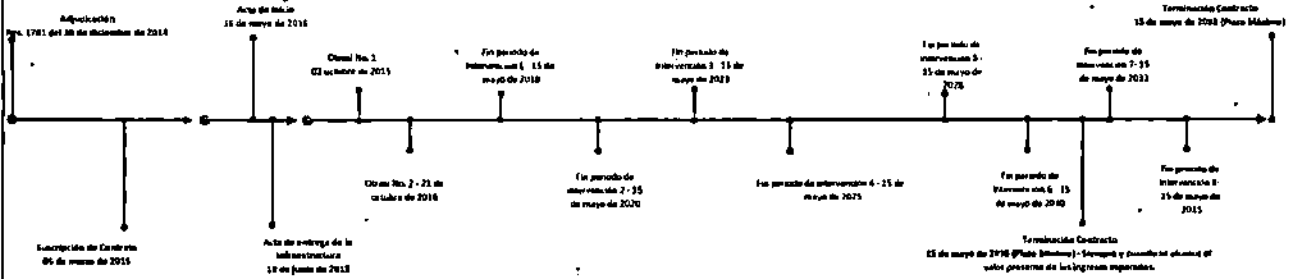

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: 00000000000000000000		
		PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		W. REGIÓN	001
		FORMATO	BOMBOF E INCUBO AFROPIETATOS		REGIÓN	26/02/2018
CONTRATO: A 07 MOTIVO: Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla - Contrato de Concesión N003 de 2015 FECHA ACTUALIZACIÓN: 31/12/2017						
1. INFORMACIÓN GENERAL						
CONCESIONARIO		INTERVENIENTA		ANI		
 Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.		 CONSORCIO INTERAEROPUERTOS		 VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL		
Representante Legal: Juan Francisco Herrera Bojanili		Representante Legal: David Aníbal Briceno		Supervisor del Contrato: María Eugenia Ariza Lujano		
Nº contrato: 003 - 2015		Nº contrato: 196 - 2015		Gerente de Proyectos Aeroportuarios		
Composición Accionaria		Composición Accionaria		Apoyo a la Supervisión		
Invercor Internacional S.A.S. 37% Grupo Universal S.A. 41,00% Valcor S.A. 41,00%		J. Felipe de la R. O. S.A. 30% GRS Ingeniería S.A.S. 30% Inver S.A.S. 61%		José Alí Muñoz Vargas Teresa Pinilla Uribe José Vargas Miranda María Elena Álvarez Álvaro Páez Lucero Néstor Palacios Germán Arturo Rodríguez Guzmán Víctor Eugenio Sánchez Zapata Jaime Martínez Marín Dayr Maldonado Sierra		
Aeropuerto:		Ernesto Cortissoz				
Objeto del Contrato:		Realizar la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación, modernización y reversión tanto del Lado Aire como del Lado Tierra del Aeropuerto.				
FECHAS IMPORTANTES						
						
2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO						
 25% % DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL		ESTADO ACTUAL Adecuación, Modernización y Mantenimiento				
SEGUIMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y LADO AIRE						
INTERVENCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN EJECUTADA (M\$)	
Lista 05-23: - Nivelación RESA. - Franjas de Pista. - Repavimentado de Pista. - Adecuación Márgenes de Pista. - Luces de Pista.	01/07/2016	27/12/2016	100%	80,11%	566.613,00	
Calles de Rodaje Existentes: - Repavimentado de Calles de Rodaje. - Adecuación Márgenes de Calle de Rodaje. - Construcción de Sobrecanchos de Rodadura. - Luces de Calle de Rodaje. - Adecuación Calles A1 y A2.	01/07/2016	27/12/2016	100%	61,41%		
Plataformas: - Reconstrucción de canchales en plataforma comercial. - Renovación señalización plataforma. - Adecuación Plataforma de carga Lado Aire.	01/07/2016	18/06/2018	76%	14,37%		
Vías vehiculares internas: - Construcción de Valado Doble. - Instalación de alumbrado en valado perimetral. - Sistema de detección perimetral.	01/07/2016	25/02/2017	100%	1,90%		
Edificio: - Adecuación a normativa instalaciones. - Edificio Terminal - Ala Nacional. - Remodelación e integración arquitectónica fachada - Ala Nacional. - Refuerzo Aire Acondicionado. - CECO, METEO, Centro de control/Centro de Emergencias. - Edificio Administrativo. - Rampa 2. - Edificio Maletas Nacionales. - Ampliación Edificio Terminal Vestibulo Salidas - Áreas L, L, R, Nacional. - Edificio de Carga.	24/10/2016	18/06/2018	72%	11,05%		

Construcción o mejoramiento de infraestructura vial y parqueaderos: -Construcción vías externas. -Adecuación nuevos parqueaderos.	01/01/2017	29/06/2017	100%	0,00%	5336,60
Ambiental. Construcción o mantenimientos de estructuras. -Ejecución sistemas ahorradores de agua. -Reforma Planta de tratamiento de aguas residuales. -Adecuación instalación de residuos peligrosos. -Mejoras iluminación interior edificio. -Desmantelamiento cementero de aeronaves. -Retirada y trasplante de árboles frutales. -Actualizar en señalización ambiental. -Adecuación de arroyos y canales existentes.	19/06/2015	18/06/2018	85%	3,35%	
Área de apoyo construcción o mejoramiento de infraestructura: -Reforma subestación eléctrica.	25/04/2017	18/06/2018	60%	0,00%	
TOTAL					\$66.940,60

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA 2018

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

Registros los cambios de dirección en Postales aprobadas
Nuevo edificio Administración
Lampa 2
Remediación CROSA, METEC, Centro de Biotecnología
Adquisición Torre de Control
Adquisición Instalaciones de Bomberos
Nuevo edificio de Cargo
Nuevo edificio G2
Osmosis en piscinas
Nuevo edificio de servicios programados

[Firma]
MARIA ELENA ARCE DIAZ - SUPERVISOR

[Firma]
ALEX
ALEXANDRO GARCIA - DIRECTOR FUERZAS ARMADAS
