ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-223
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	FECHA	9/12/2016

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CÓDIGO	AC-01	PROYECTO	Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Sarmiento Angulo Contrato No. 6000169OK de 2006	FECHA ACTUALIZACIÓN	8/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO

EL DORADO — 4 Estrellas · Mejor Staff · Mejor Aeropuerto de Suramérica

OPAIN S.A. - Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional

Gerente Natalí Leal Gomez

N.º contrato 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006

Composición Accionara



INTERVENTORÍA OPERATIVA

CONSORCIO OPERADOR AEROPORTUARIO

Directora Silvia Fernández de Castro

N.º contrato 9000070 OK del 4 de junio de 2009

Composición Accionara



ANI

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

GERENTE CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMIREZ

Equipo Profesional:

Edgardo Garciaherreros Barrera (Coordinador)
Maria Camila Bautista (Técnico)
Jose Alain Hoyos (Ambiental)
Luis Enrique Moreno Barbosa (Financiero)
Juan Manuel Cajiao Astroquiza (Jurídico)
Paula Bedoya (Riesgos)
Clara Porras (Social)

INTERVENTORIA FINANCIERA

JAHV MCGREGOR

Gerente Crisanto Gonzalez Rivera

N.º contrato Contrato 7000357 OH de 2007

Composición Accionara



INTERVENTORIA PROYECTO

INTERSA S.A

Directora Isabel Leon Reyes

N.º contrato Contrato VGCON 425-2023

Composición Accionara



Aeropuertos	Internacional Eldorado "Luis Carlos Galán Sarmiento" BOGOTÁ D.C.
Objeto del Contrato:	Contrato de Concesión para la Administración, Modernización y Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento del Área Concesionada del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.

FECHAS IMPORTANTES

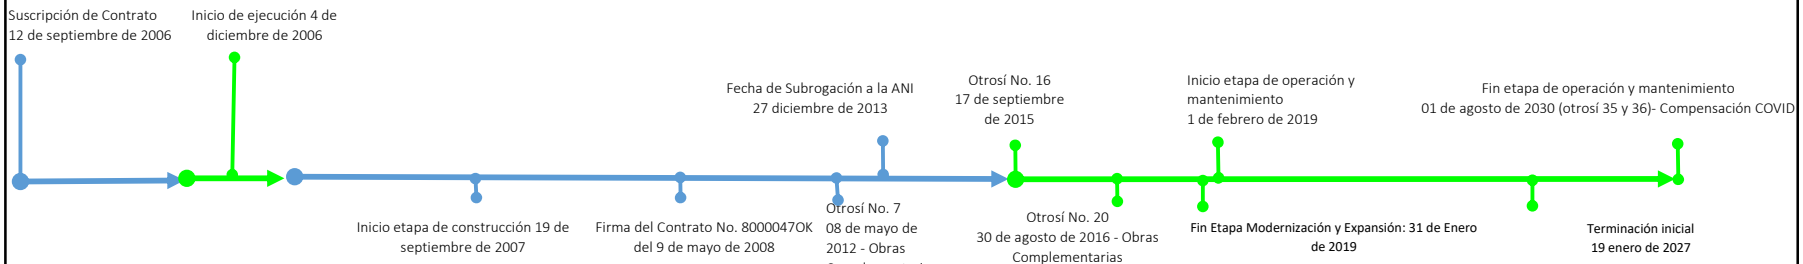

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

77%

ESTADO ACTUAL Etapa Final (Operación y Mantenimiento)

% del plazo total del contrato de concesión (incluye plazo compensación por el Covid-19 del otrosí 36)

SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M$)
No aplica - Etapa Final					
Plataforma Hangar AV y zonas colindantes	26/12/2023	25/11/2025	79,79%	86,77%	$ 116.384,00

PUESTA EN OPERACIÓN 2020

TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
		INICIO DE OPERACIÓN PROYECTO PLATAFORMA	

VERIFICADO

CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMIREZ
GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

EDGARDO GARCIA HERRERO BARRERA
Experto 3 Grado
