 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GADF-F-022
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 001
	FORMATO	ACTA DE INICIO	Fecha: 14/11/2013

CONTRATO No. VPRE-484 del 22 de noviembre de 2013

OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MIGRACION DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS CON MICROSOFT LYNC 2010 A MICROSOFT 2013 INTEGRADA CON OFFICE 365 PLAN E4, SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE GATEWAY SBC AUDIOCODES MEDIANT 800 PARA LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI”

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$49.500.000)


PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONTRATISTA: PS COMMUNICATIONS LTDA.

En Bogotá, a los 4 días de diciembre de 2013 en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura se reunieron JOSÉ ALBERTO SALAMANCA SARMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No79.558.013, obrando en nombre y representación legal de PS COMMUNICATIONS LTDA., con NIT 830.083.328-7, en su calidad de Contratista, y ALEJANDRO FORERO GUZMÁN, Coordinación G.I.T. Sistemas de Información y Tecnología, de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entrono de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en su calidad de supervisor, para dar comienzo real e inmediato al cumplimiento del objeto del contrato, cuyas obligaciones serán las siguientes:

1. OBLIGACIONES GENERALES

- El CONTRATISTA se compromete para con la Agencia Nacional de Infraestructura a entregar los equipos requeridos por la Entidad debidamente instalados y configurados, con altas calidades técnicas, garantizando la buena calidad de los mismos, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico.
- Mantener el personal mínimo propuesto durante la ejecución del contrato, el cual no podrá ser modificado sin el consentimiento previo, expuesto y escrito de la Agencia. En el evento que se solicite cambio de personal, el nuevo personal propuesto deberá cumplir iguales o mayores requisitos que el inicialmente propuesto. En todo caso, el contratista se obliga a contar con todo el personal que requiera para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.
- Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que haya de emplear para la ejecución del contrato.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GADF-F-022
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 001
	FORMATO	ACTA DE INICIO	Fecha: 14/11/2013

- Cumplir en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), SENA, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por la Agencia Nacional de Infraestructura por el supervisor del contrato, durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo certificación expedida por el revisor fiscal, cuando se requiera por ley, o por el Representante Legal, según el caso.


2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma (PS_Cronograma_Lync_Migracion V1) se adjunta al actual acta, para la ejecución del objeto contractual.

Encontrándose el contratista en la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, se procede a realizar la suscripción de la presente acta de inicio, que implica la aceptación de las condiciones para la debida ejecución del objeto del contrato.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron al día 4 del mes de diciembre de 2013.


ALEJANDRO FORERO
 Supervisor


JOSÉ ALBERTO SALAMANCA SARMIENTO
 Contratista

Proyecto: Bibiana Andrea Alvarez, Funcionaria de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno.

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	01 dic '13							
						M	X	J	V	S	D	L	
36	Instalación de Software	2 hrs	jue 05/12/13	jue 05/12/13 35									
37	Creación de Instancia de Web Application	2 hrs	jue 05/12/13	jue 05/12/13 36									
38	Creación de Certificados	2 hrs	vie 06/12/13	vie 06/12/13 37									
39	Pruebas de Funcionalidad	3 hrs	vie 06/12/13	vie 06/12/13 38									
40	Instalación y Configuración de ISS ARR Reverse Proxy	1,63 días	vie 06/12/13	mar 10/12/13 34									
41	Instalación de Sistema Operativo	4 hrs	vie 06/12/13	lun 09/12/13 39									
42	Configuración de Direccionamiento	1 hr	lun 09/12/13	lun 09/12/13 41									
43	Instalación de Parches	3 hrs	lun 09/12/13	lun 09/12/13 42									
44	Configuración de IIS ARR	4 hrs	lun 09/12/13	mar 10/12/13 43									
45	Publicación de Certificados	1 hr	mar 10/12/13	mar 10/12/13 44									
46	Pruebas de Funcionalidad en Direccionamiento Interno	3 hrs	vie 06/12/13	vie 06/12/13 31									
47	Instalación y Configuración de Edge Server	2,13 días	mar 10/12/13	jue 12/12/13 40									
48	Instalación de Sistema Operativo	4 hrs	mar 10/12/13	mar 10/12/13 46									
49	Configuración de Direccionamiento	1 hr	mar 10/12/13	mar 10/12/13 48									
50	Instalación de Parches	3 hrs	mar 10/12/13	mié 11/12/13 49									
51	Configuración y Publicación de Topología	1 hr	mié 11/12/13	mié 11/12/13 50									
52	Instalación de Software	4 hrs	mié 11/12/13	mié 11/12/13 51									
53	Configuración de Certificados	1 hr	mié 11/12/13	mié 11/12/13 52									
54	Pruebas de Funcionalidad en Direccionamiento Interno	3 hrs	jue 12/12/13	jue 12/12/13 53									
55	Instalación y Configuración de Web Server App Windows	3,13 días	jue 12/12/13	mar 17/12/13 47									
56	Instalación de Sistema Operativo	4 hrs	jue 12/12/13	jue 12/12/13 54									
57	Configuración de Direccionamiento	1 hr	jue 12/12/13	jue 12/12/13 56									
58	Instalación de Parches	4 hrs	vie 13/12/13	vie 13/12/13 57									
59	Configuración de IIS Terminal Service	8 hrs	vie 13/12/13	lun 16/12/13 58									
60	Instalación de Software	3 hrs	lun 16/12/13	lun 16/12/13 59									
61	Configuración de Certificados	1 hr	lun 16/12/13	lun 16/12/13 60									
62	Pruebas de Funcionalidad en Direccionamiento Interno	4 hrs	mar 17/12/13	mar 17/12/13 61									
63	Instalación de Enterprise Voice de Lync	3,38 días	mar 17/12/13	vie 20/12/13 55									
64	Creación de Troncal Elastix en el Topology	2 hrs	mar 17/12/13	mar 17/12/13 62									
65	Creación de Troncal de SBC en el Topology	2 hrs	mar 17/12/13	mar 17/12/13 64									
66	Creación de Rol en el Topology	2 hrs	mié 18/12/13	mié 18/12/13 65									
67	Publicación de Topología	1 hr	mié 18/12/13	mié 18/12/13 66									
68	Instalación de Rol	3 hrs	mié 18/12/13	mié 18/12/13 67									
69	Configuración de Extensiones	2 hrs	mié 18/12/13	mié 18/12/13 68									
70	Configuración de Dial Plans	2 hrs	jue 19/12/13	jue 19/12/13 69									

Project: RCN_TMG
Date: mié 27/11/13

Task: External Milestone

Split: Tarea inactiva

Milestone: Hitó inactivo

Summary: Resumen inactivo

Project Summary: Tarea manual

External Tasks: Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progress

Deadline

Page 2

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	01 dic '13						
						M	X	J	V	S	D	L
71	Configuración de Voice Policy	2 hrs	jue 19/12/13	jue 19/12/13 70								
72	Configuración de Rutas	2 hrs	jue 19/12/13	jue 19/12/13 71								
73	Configuración de Troncales	1 hr	jue 19/12/13	jue 19/12/13 72								
74	Publicación de troncal para Coexistencia con Elastix	1 hr	jue 19/12/13	jue 19/12/13 73								
75	Integración de Elastix y Lync	2 hrs	vie 20/12/13	vie 20/12/13 74								
76	Integración de Lync con SBC a la PSTN	1 hr	vie 20/12/13	vie 20/12/13 75								
77	Pruebas de Funcionalidad	4 hrs	vie 20/12/13	vie 20/12/13 76								
78	Instalación y Configuración de SBC	1,13 días	vie 20/12/13	lun 23/12/13 63								
79	Configuración de Direccionamiento IP Privado	0,5 hrs	vie 20/12/13	vie 20/12/13 77								
80	Configuración de Direccionamiento Público Trunk SIP	0,5 hrs	vie 20/12/13	vie 20/12/13 79								
81	Configuración de Rutas	2 hrs	lun 23/12/13	lun 23/12/13 80								
82	Configuración de Manipulaciones	1 hr	lun 23/12/13	lun 23/12/13 81								
83	Configuración de SIP Group, SDR e IP Profile	2 hrs	lun 23/12/13	lun 23/12/13 82								
84	Pruebas de Funcionalidad	3 hrs	lun 23/12/13	lun 23/12/13 83								
85	Configuración de Telefonos (80) Yealink	2,13 días	mar 24/12/13	jue 26/12/13 78								
86	Configuración de Telefonos Para Coexistencia	10 hrs	mar 24/12/13	mié 25/12/13 84								
87	Configuración de Extensiones	3 hrs	mié 25/12/13	mié 25/12/13 86								
88	Pruebas de Funcionalidad	4 hrs	mié 25/12/13	jue 26/12/13 87								

Task

External Milestone

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progress

Deadline

Project: RCN_TM
Date: mié 27/11/13


Page 3

08 dic '13

15 dic '13


22 dic '13

L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S

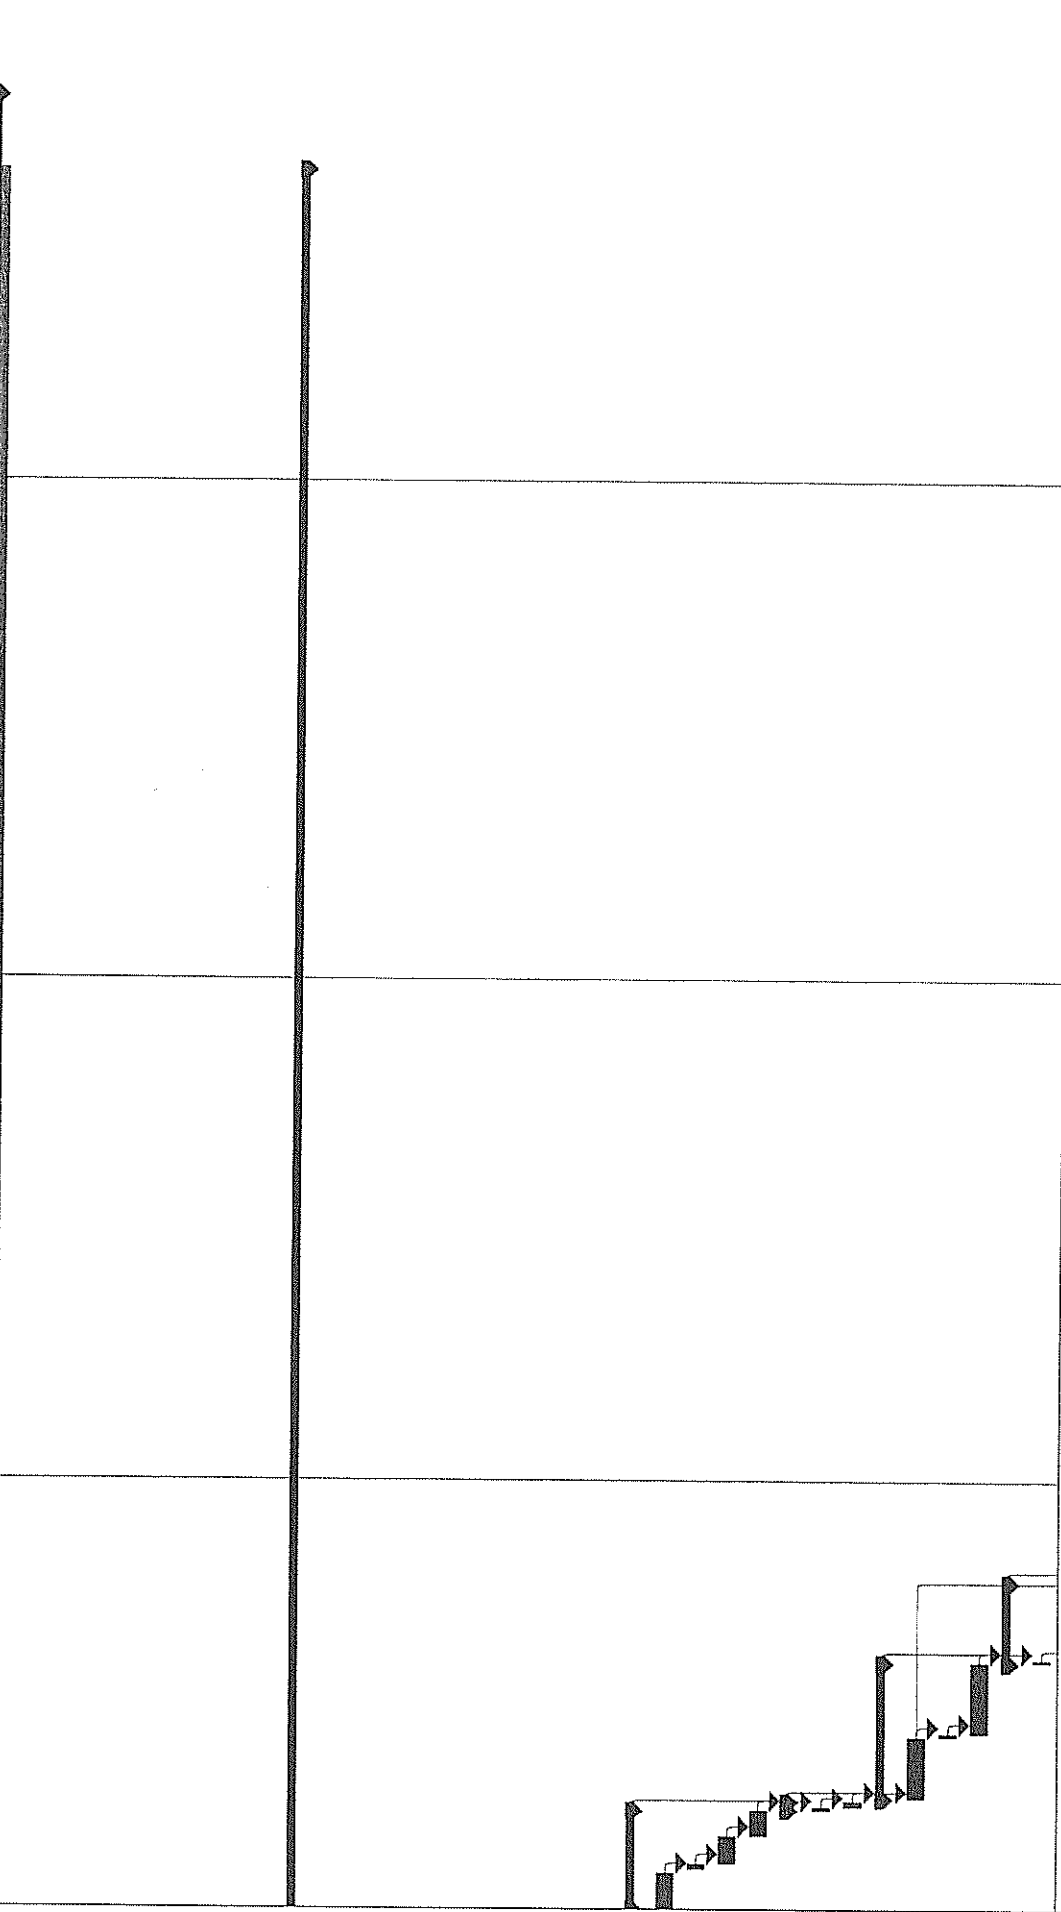


Task		External Milestone		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Deadline	

Project: RCN_TM
Date: mié 27/11/13

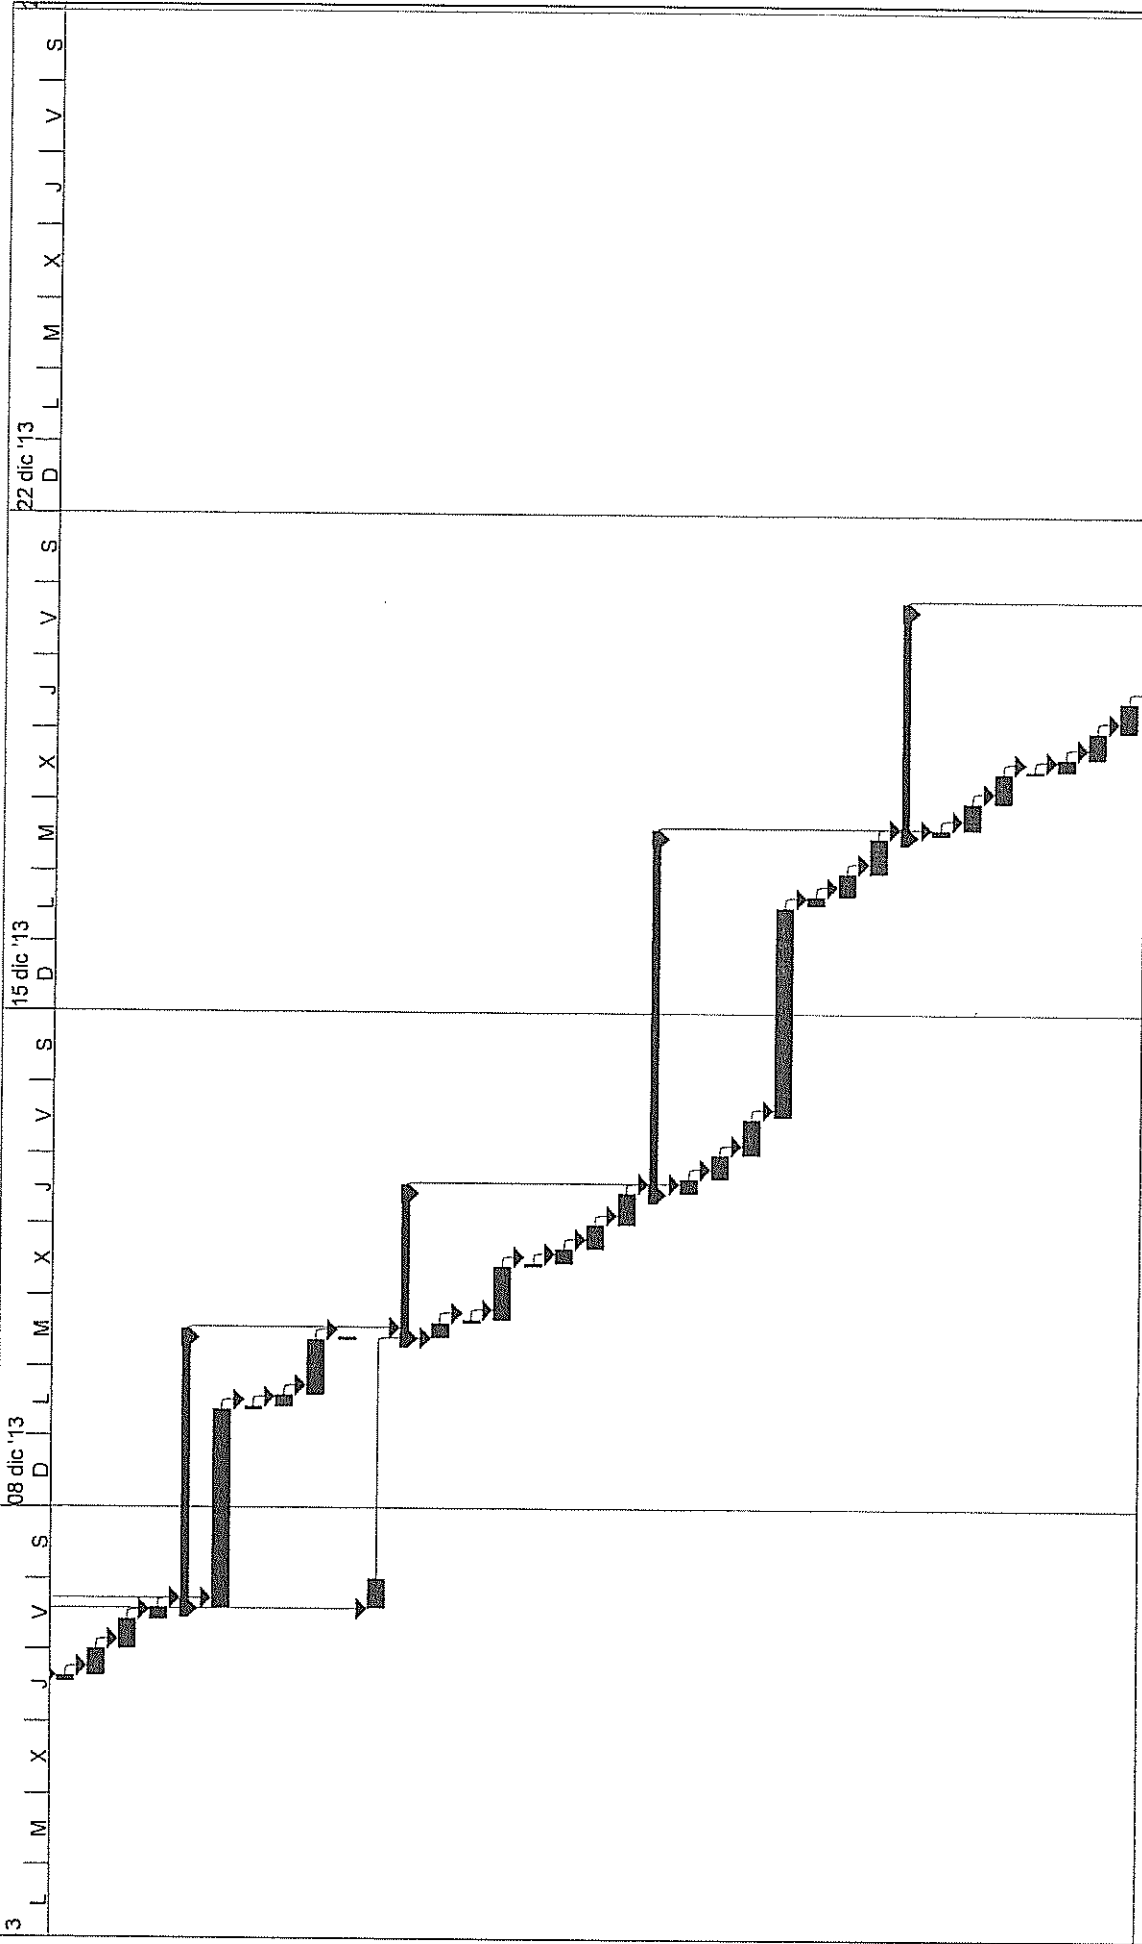

<p>Project: RCN_TMG Date: mié 27/1/13</p>	<p>Task</p>	<p>External Milestone</p>	<p>Informe de resumen manual</p>
<p>Split</p>	<p>Tarea inactiva</p>	<p>Resumen manual</p>	<p>Sólo el comienzo</p>
<p>Milestone</p>	<p>Hilo inactivo</p>	<p>Resumen inactivo</p>	<p>Sólo fin</p>
<p>Summary</p>	<p>Tarea manual</p>	<p>Progress</p>	<p>Deadline</p>
<p>Project Summary</p>	<p>Sólo duración</p>		
<p>External Tasks</p>			

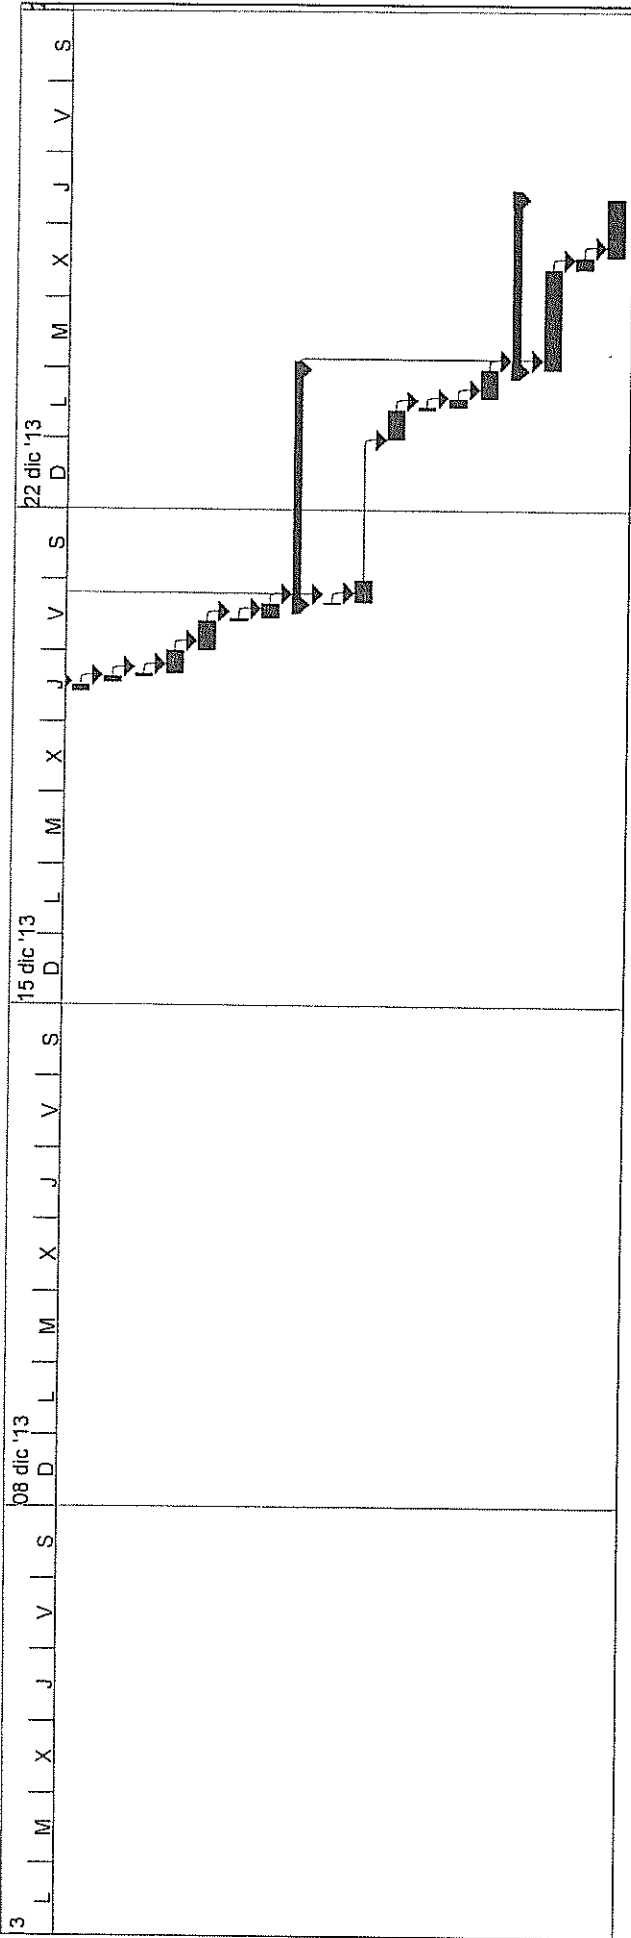

Task		External Milestone		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	[]
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin]]
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Deadline	

Project: RCN_IMG
Date: mié 27/11/13
