

**HOJA DE DATOS INTERVENTORIA – CONCESIÓN MALLA VIAL DEL META**


**Tabla 1** Características del Contrato de Interventoría

<p><b>Objeto</b></p>	<p><b>SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO No. VJ-VE-APP-IPV-001-2015 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO “MALLA VIAL DEL META”</b></p>
<p><b>Alcance Contrato de Concesión</b></p>	<p>Las vías objeto de la Concesión “Malla Vial del Meta”, tienen una longitud total estimada de 354 kilómetros y su recorrido discurre íntegramente en el Departamento del Meta.</p> <p>El departamento del Meta ha venido presentado un crecimiento exponencial en su participación sobre el PIB de la Nación, en parte como consecuencia del incremento en la producción de hidrocarburos. Por su parte Villavicencio, se ha convertido en el polo de desarrollo de todos los Llanos Orientales. El incremento en la producción de hidrocarburos, combinado con el desfase entre la capacidad de transporte vía oleoductos y la producción petrolera de la región, origina un fuerte impacto en el tráfico en las vías nacionales y locales del Departamento y en especial en los accesos a la ciudad de Villavicencio desde Puerto López y Granada.</p> <p>Actualmente se observan con facilidad altos niveles de congestión y accidentalidad en estas vías debido al alto tráfico de tracto-camiones que pasan por las vías del departamento y de la ciudad de Villavicencio. Por eso, existe la necesidad de proveer la infraestructura necesaria para facilitar y canalizar el tránsito de larga trayectoria que logre disminuir el impacto de dicho tráfico sobre la calidad de vida de la población.</p> <p>El Proyecto cuenta con dos componentes a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i). Corredor Granada – Villavicencio – Puerto López – Puerto Gaitán – Puente Arimena</li> <li>ii). Anillo Vial de Villavicencio y Accesos a la Ciudad.</li> </ul> <p>Dentro de este componente se encuentran las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Ampliación del Anillo Vial de Villavicencio (completando los dos (2) carriles faltantes en el costado occidental del Anillo con el fin de duplicar la infraestructura actualmente en ejecución por la Gobernación del Meta y alcanzar una sección con cuatro (4) carriles por sentido),</li> <li>2). Conexión de la intersección Catama con la vía Cumaral a la altura del Peaje de Puente Amarillo,</li> </ul>

- 3). Conexión de la Vía antigua a Bogotá con la vía nueva en inmediaciones del túnel de Buenavista,
- 4). Doble Calzada Fundadores – Ciudad Porfía y
- 5). Doble Calzada Séptima Brigada – Río Ocoa.

Es de aclarar que estas dos últimas dobles calzadas serán construidas por la Gobernación del Meta y operada esta infraestructura por el Concesionario una vez se reciban estas obras de la Gobernación.

#### Localización general del Proyecto

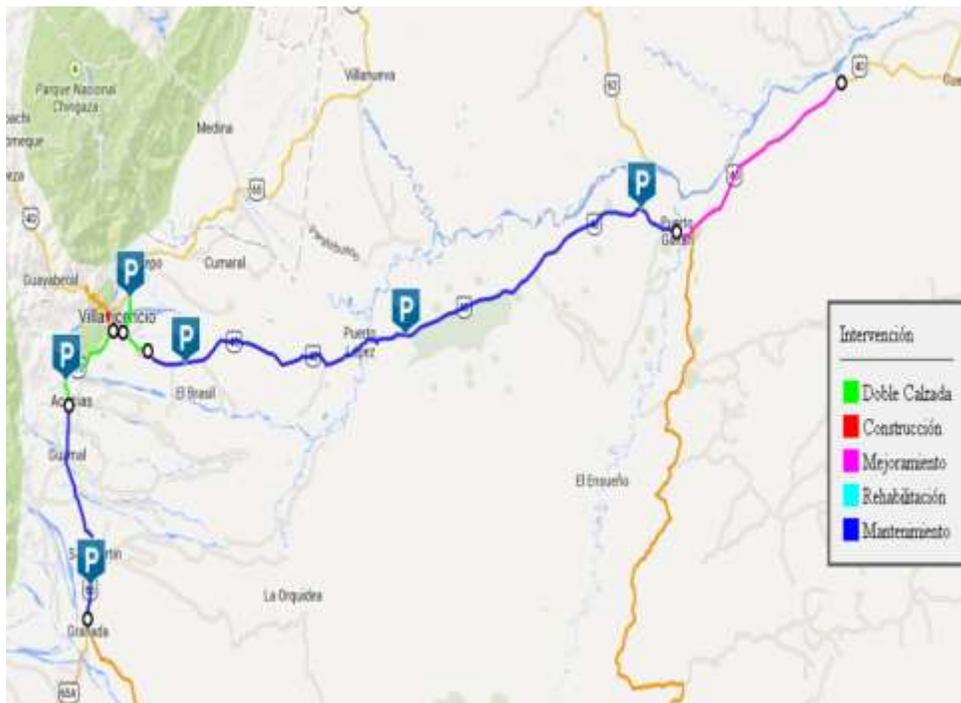

#### Etapa Preoperativa de la Concesión:

Esta etapa tendrá una duración total máxima de SETENTA Y DOS (72) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato. Esta etapa está compuesta por la Fase de Preconstrucción y la Fase de Construcción.

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el Apéndice Técnico 1 –

	<p>Alcance del Proyecto para cada una de las unidades funcionales y demás Especificaciones Técnicas.</p> <p><b>Operación de la Vía durante la Etapa Preoperativa</b></p> <p>Desde el momento de la suscripción del Acta de Inicio y hasta la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional de cada una de las divisiones del proyecto, el Concesionario tendrá la obligación de operar las vías que le fueron entregadas de acuerdo con los principios establecidos en el Apéndice Técnico 2 – Operación y Mantenimiento del contrato de concesión.</p> <p>Será obligación del Concesionario cumplir con los niveles de servicio mínimo para la Etapa Pre operativa que se establecen en la Tabla 1. “Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa” del Apéndice Técnico 2 – Operación y Mantenimiento del contrato de concesión, a partir del vencimiento del tercer mes contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Para los sectores de vía que se encuentran a nivel de afirmado o sub rasante no se realizará la medición del Nivel de Servicio E6.</p>
<p><b>Alcance Interventoría</b></p>	<p>El objeto del contrato incluye pero no se limita a revisar, verificar, analizar y conceptuar permanentemente todos los aspectos técnicos, financieros, contables, socios prediales, medio-ambientales, operativos, jurídicos y administrativos relacionados con el Contrato de Concesión que se derive del proceso APP de Iniciativa Privada No. VJ-VE-APP-IPV-001-2015, éste incluye todos los documentos que a la fecha, complementan, modifican, aclaran y adicionen el respectivo contrato de concesión; a efecto de constatar el cumplimiento, por parte del contratista (concesionario), de las condiciones establecidas en el mismo, para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos.</p> <p>Las actividades que deberá ejecutar el interventor consiste en el seguimiento, control, supervisión y verificación del cumplimiento de las normas e indicadores de todas las actividades que involucran la Etapa Preoperativa (Fase de Preconstrucción y Fase de Construcción) y la Etapa de Operación y Mantenimiento del contrato de concesión bajo un esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada correspondiente al proyecto denominado “MALLA VIAL DEL META”, al igual que todas las actividades técnicas, económicas, financieras, jurídicas, administrativas, operativas, medio ambientales y socio prediales de este corredor.</p> <p>Para cumplir con las actividades a su cargo, el interventor deberá realizar el control de todas los aspectos inherentes al proyecto, de forma integral, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, en el Contrato de Concesión que surta del proceso licitatorio, dentro de las que se encuentran entre otras las Especificaciones Generales de Construcción, Normas de mantenimiento y rehabilitación de</p>

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-006-2015  
Anexo 10 – HOJA DE DATOS

	<p>Carreteras vigentes generales, Manual de Señalización, particulares y Manual de diseño geométrico a fin de efectuar un adecuado seguimiento y supervisión de todos los aspectos administrativos, técnicos, operativos, legales, ambientales, prediales, sociales, financieros y tributarios que involucra la concesión objeto de interventoría.</p>
<b>Plazo</b>	<p>El plazo del contrato es de OCHENTA Y CUATRO (84) meses contados a partir de la fecha en que el Vicepresidente de Gestión Contractual imparta la Orden de Inicio.</p>
<b>Presupuesto Oficial</b>	<p>El presupuesto oficial máximo estimado es de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ (\$34.695.893.410) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA., a ser pagado dentro del plazo de ochenta y cuatro (84) meses. Este valor fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un análisis técnico y económico considerando el alcance del Contrato de Interventoría.</p> <p>El valor se fija en la suma única que el adjudicatario en su propuesta económica solicite en pesos de diciembre de 2013, (incluido IVA).</p> <p>El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato de Interventoría y en el Anexo de Metodología y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.</p> <p>Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del contrato se estableció a precio global fijo.</p> <p>El valor del contrato de Interventoría que se suscriba con ocasión de este concurso de méritos abierto, se pagará con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo que deberá fondear la sociedad Concesionaria adjudicataria de la Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPV-001-2015, en el cual se administrarán los recursos que ingresan a la “Subcuenta de Interventoría y Supervisión” conforme al literal d) del numeral 4.5 “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo” del contrato de concesión en su Parte General.</p>
<b>Forma de pago</b>	<p>(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma única de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL</p>

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-006-2015  
Anexo 10 – HOJA DE DATOS

CUATROCIENTOS DIEZ (\$34.695.893.410) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente documento y en el Anexo de Requerimientos Técnicos. Las Partes aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenida en la Propuesta del Interventor no implica que el Contrato se haya acordado a precios unitarios, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La tabla de precios que se encuentra anexa al contrato, sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha tabla.

(b) El valor mencionado en el literal (a) anterior tendrá la siguiente discriminación por etapas:

Etapa Preoperativa		Etapa Operación y Mantenimiento
Fase Preconstrucción	Fase Construcción	
\$3.139.215.270	\$28.772.720.736	\$2.783.957.404

(c) Sin perjuicio de lo anterior y con fines de claridad únicamente, se establece la cuota fija mensual en pesos constantes de diciembre de 2013, la cual se determinó tomando como base el valor global fijo ofertado por etapa dividido por el plazo expresado en meses por etapa del Contrato de Interventoría, el cual corresponde a la suma mensual que a continuación se discrimina:

Etapa Preoperativa		Etapa Operación y Mantenimiento
Fase Preconstrucción	Fase Construcción	
\$261.601.272	\$479.545.346	\$ 231.996.450

(d) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte de la Agencia o la Fiducia a cargo o por el concesionario, según corresponda, una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia a los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-006-2015  
Anexo 10 – HOJA DE DATOS

- (e) Siempre que el **Interventor** tenga derecho a recibir el Pago en los términos del presente Contrato, se pagará la cuota mensual con cargo a la Subcuenta Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en esta cláusula.
- (f) La **Agencia** tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago del **Interventor** ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de Concesión. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberá expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos del Proyecto de Concesión. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le serán reconocido intereses de alguna índole al **Interventor**, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría.
- (g) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo aprobado por la ANI durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado con la presentación de la Oferta Económica. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del presente Contrato.
- (h) Los valores señalados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos constantes de diciembre de 2013. En la fecha de facturación por parte del Interventor deben ser indexados conforme con la siguiente fórmula:

$$Cuota_{(n,m)} = Cuota_{(Dic/2013)} \times \frac{IPC_{(n,m)}}{IPC_{(Dic/2013)}}$$

Donde:

$Cuota_{(n,m)}$ *	Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor en el respectivo año calendario “m”.
$Cuota_{(Dic/2013)}$	Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor, expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013
$IPC_{(n,m)}$ *	IPC del mes “n” de pago de cada respectivo año calendario “m” publicado por el DANE
$IPC_{(Dic/2013)}$	IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y último pago se realizara de acuerdo al número de días reales del mes de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo como base mes

	<p>de 30 días.</p> <p>Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución de alguna de las etapas del Contrato de Concesión se prolongue más allá del plazo establecido en este documento, la AGENCIA reconocerá al Interventor un único pago mensual o su equivalente en días, según corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario. El valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma de pago, corresponderá al valor mensual o su equivalente en días, de conformidad con la etapa en la que se encuentre la ejecución del contrato de Concesión.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, el valor total del contrato de Interventoría expresado en pesos de diciembre de 2013 será fijo.</p>
--	--

### Personal y Cargas de Trabajo

#### PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio mínimo que debe ser presentado a la Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.

El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos deben ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente.

Para firmar acta de inicio del contrato de interventoría, el siguiente personal profesional deberá ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 días calendario después de celebrada la audiencia de adjudicación del proceso.

**Tabla 2.** Personal obligatorio mínimo que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de inicio de interventoría.

CANT	PERSONAL PROFESIONAL
1	Director de Interventoría
1	Subdirector Técnico

El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) días

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-006-2015  
Anexo 10 – HOJA DE DATOS

*hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones, aplicarán los mismos términos indicados.*

El personal mínimo obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, se detallará en la Tabla 4. La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia de Estructuración de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de concesión vigentes.

En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista.

Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la siguiente manera:

**Tabla 3. Homologación de estudios.**

TITULO	Experiencia Profesional	Experiencia Específica
Especialización	Dos (2) años	Un (1) año
Maestría	Tres (3) años	Uno y medio (1.5) años
Doctorado	Cuatro (4) años	Dos (2) años

En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere necesaria para demostrar la equivalencia del título.

**IP MALLA VIAL DEL META.**

**Tabla 4.** Personal Mínimo Obligatorio y Dedicaciones

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-006-2015**  
**Anexo 10 – HOJA DE DATOS**

CARGO / OFICIO (1)	Categoría	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		ETAPA PREOPERATIVA						ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
		FASE PRECONSTRUCCIÓN			FASE CONSTRUCCIÓN					
		CANTIDAD DE PERSONAS	% DE DEDICACION	Tiempo Total en meses	CANTIDAD DE PERSONAS	% DE DEDICACION	Tiempo Total en meses	CANTIDAD DE PERSONAS	% DE DEDICACION	Tiempo Total en meses
Director de Interventoría	1	1	50%	12	1	100%	60	1	50%	12
Subdirector Técnico - Operativo	2	1	100%	12	1	100%	60	1	50%	12
Subdirector Financiero	2	1	50%	12	1	50%	60	1	25%	12
Subdirector Jurídico	2	1	25%	12	1	50%	60	1	25%	12
Ingeniero Residente Ambiental	4	1	50%	12	1	100%	60	1	25%	12
Residente Social	4	1	50%	12	1	50%	60	1	25%	12
Ingeniero Residente Operativo	4	1	100%	12	1	100%	60	1	100%	12
Ingeniero Residente Técnico	4	1	50%	12	3	100%	60	1	100%	12
Ingeniero Residente Túneles	4	1		12	1		60	1		12
Ingeniero Residente Puentes	4	1	25%	12	1	100%	60	1	25%	12
Ingeniero Residente Geólogo	4	1		12	1		60	1		12
Ingeniero Residente de Redes	4	1	25%	12	1	50%	60	0	0%	12
Ingeniero Residente SISO	4	1	25%	12	1	100%	60	1	25%	12
Especialista en Sistemas (Túnel)	3	1		12	1		60	1		12
Especialista en Estructuras	3	1	50%	12	1	50%	60	1	25%	12
Especialista en Pavimentos	3	1	50%	12	1	50%	60	1	25%	12
Especialista en Túneles	3	1		12	1		60	1		12
Especialista en Geotecnia y Suelos	3	1	25%	12	1	25%	60	1	25%	12
Especialista en Hidráulica e Hidrología	3	1	25%	12	1	50%	60	1	25%	12
Especialista en Vías	3	1	25%	12	1	25%	60	1	25%	12
Especialista SISO	3	1	25%	12	1	25%	60	1	25%	12
Especialista Ambiental	3	1	50%	12	1	50%	60	1	25%	12
Especialista en Tránsito y Transporte	3	1	25%	12	1	25%	60	1	15%	12
Ingeniero Eléctrico	5			12			60	1		12
Ingeniero Mecánico	5			12			60	1		12
Abogado Especialista en Derecho Administrativo	4	1	20%	12	1	50%	60	1	25%	12
Abogado Gestión Predial y de Expropiaciones	4	1	50%	12	1	100%	60			12
Auditor de Sistemas y/o pesaje y/o tarifas	5	1	50%	12	1	50%	60	1	50%	12
Profesional Aseguramiento y Gestión Calidad	5	1	25%	12	1	50%	60	1	25%	12
Profesional Auditor Interno de Calidad	5	1	20%	12	1	25%	60	1	20%	12
Profesional Auditor Seguridad Vial	5	1	25%	12	1	50%	60	1	50%	12
Profesional en Área Socio- Ambiental	5	1	25%	12	2	100%	60	1	25%	12
Profesional en Área Predial	5	1	50%	12	2	100%	60	1	25%	12
Profesional Financiero	5	1	25%	12	1	100%	60	1	50%	12
Profesional Contable	5	0	25%	12	1	50%	60	1	50%	12
Auxiliar de Ingeniería SISOMA	8	1	50%	12	1	100%	60	1	25%	12
Auxiliar de Ingeniería	8	1	100%	12	2	100%	60	1	100%	12
Auxiliar de Ingeniería Predial	8	1	100%	12	1	100%	60	1	25%	12
Auxiliar Social	8	1	100%	12	2	100%	60	1	25%	12
Auxiliar de Ingeniería Peajes y Operativo	8	1	100%	12	1	100%	60	1	100%	12
Topógrafo		1	50%	12	2	100%	60	1	20%	12
Cadenero I		1	50%	12	2	100%	60	1	20%	12
Cadenero II		1	50%	12	2	100%	60	1	20%	12
Inspector de Obra		1	100%	12	4	100%	60	1	100%	12
Inspector SISOMA		0	100%	12	4	100%	60	1	50%	12
Asistente Administrativa (Secretaría) oficina y ANI		2	100%	12	2	100%	60	2	100%	12
Conductor		1	100%	12	2	100%	60	2	100%	12

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-006-2015  
Anexo 10 – HOJA DE DATOS

OTROS COSTOS	K	M	N		M	N	O	P
	UNIDAD	FASE PRECONSTRUCCIÓN			FASE CONSTRUCCIÓN		ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
		CANTIDAD	MESES DE USO O KM TOTAL O GLOBAL		CANTIDAD	MESES DE USO O KM TOTAL O GLOBAL	CANTIDAD	MESES DE USO O KM TOTAL O GLOBAL
Computador portátil - (Incluye ANI)	UND	3	Global					
Computadores de escritorio - (Incluye ANI)	UND	10	Global					
Escaner	UND	1	Global					
Cámara fotográfica	UND	10	Global					
Adquisición de equipos celulares	UND	10	Global					
Equipos de video peajes	UND	5	Global		2	Global		
Adquisición plan telefonía celular	UND	10	12		10	60	10	12
Alquiler de Vehículo (>=2000 cc)	Mes	2	12		2	60	2	12
Alquiler Equipo de Topografía	Mes	1	12		2	60	1	12
Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos y Dotación)	Mes	1	12		2	60	2	12
Papelaría, fotocopias, heliografías, informes y otros	Mes	1	12		1	60	1	12
Comunicaciones (telefonía, fax, email, etc)	Mes	1	12		1	60	1	12
Medición Índice de estado, defectometría y demás ensayos requeridos.	Km	2	271		10	271	2	390
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo	Mes	1	2		1	60	1	2
